

RvB

Projectbeheerder  
Project start/einde data

29 aug. 2022 - 22 dec. 2023

% Gereed  
Taak  
Personen

15%  
36  
1

Interne verbouwing OM aan de Paterswoldseweg te Groningen


## Taak

Naam	Begin datum	Eind datum	Duur
<b>INKOOP ADVIES</b>	29-08-22	23-09-22	20
Voorbereiding/ aanvraag	29-08-22	02-09-22	5
Rekentijd adviseur	05-09-22	09-09-22	5
Beoordeling offerte adviseur & gunning	12-09-22	23-09-22	10
<b>BESTEK</b>	26-09-22	10-03-23	105
Bestek (MX13)	26-09-22	03-02-23	85
Toets bestek (RVB)	06-02-23	17-02-23	10
Aanpassing bestek (adviseur)	20-02-23	10-03-23	10
<b>INRICHTING (GISPEN)</b>	28-11-22	22-06-23	130
Ontwerp inrichting (MX13/ Gispen)	28-11-22	03-02-23	45
Offerteaanvraag Gispen	06-02-23	10-03-23	20
Opdracht aan Gispen (OM)	13-03-23	17-03-23	5
Levertijd/ voorbereiding Gispen (12 weken)	20-03-23	22-06-23	60
Voorbereiding aanbesteding (RVB)	23-11-22	20-01-23	38
<b>AANBESTEDING</b>	13-03-23	15-06-23	60
Aanvraag naar de aannemers (RVB)	13-03-23	17-03-23	5
Offerte Aannemer	20-03-23	24-05-23	40
Aanwijs op locatie	22-03-23	22-03-23	1
Stellen van vragen (aannemers)	20-03-23	07-04-23	15
Nota (MX13)	11-04-23	24-04-23	10
Beoordeling offerte	25-05-23	08-06-23	10
Offerte aannemers binnen	24-05-23	24-05-23	0
Gunning (RVB)	09-06-23	15-06-23	5
<b>UITVOERING</b>	16-06-23	21-12-23	120
Engineering & levertijd wanden	16-06-23	14-09-23	50
Levertijd tourlock	16-06-23	16-11-23	95
Uitvoering op locatie	15-09-23	21-12-23	70
Fase 1 (4e rechts)	15-09-23	28-09-23	10
Fase 2 (3e rechts)	29-09-23	12-10-23	10
Fase 3 (3e links)	13-10-23	26-10-23	10
Fase 4 (2e rechts)	27-10-23	09-11-23	10
Fase 5 (2e links)	10-11-23	16-11-23	5
Fase 6 (1e rechts)	17-11-23	23-11-23	5
Fase 7 (1e links)	24-11-23	07-12-23	10
Fase 8 (BG- tourlock)	08-12-23	21-12-23	10
<b>OPLEVERING</b>	22-12-23	22-12-23	0


Personen

Naam  
Radek Nosek

Standaard rol  
RVB

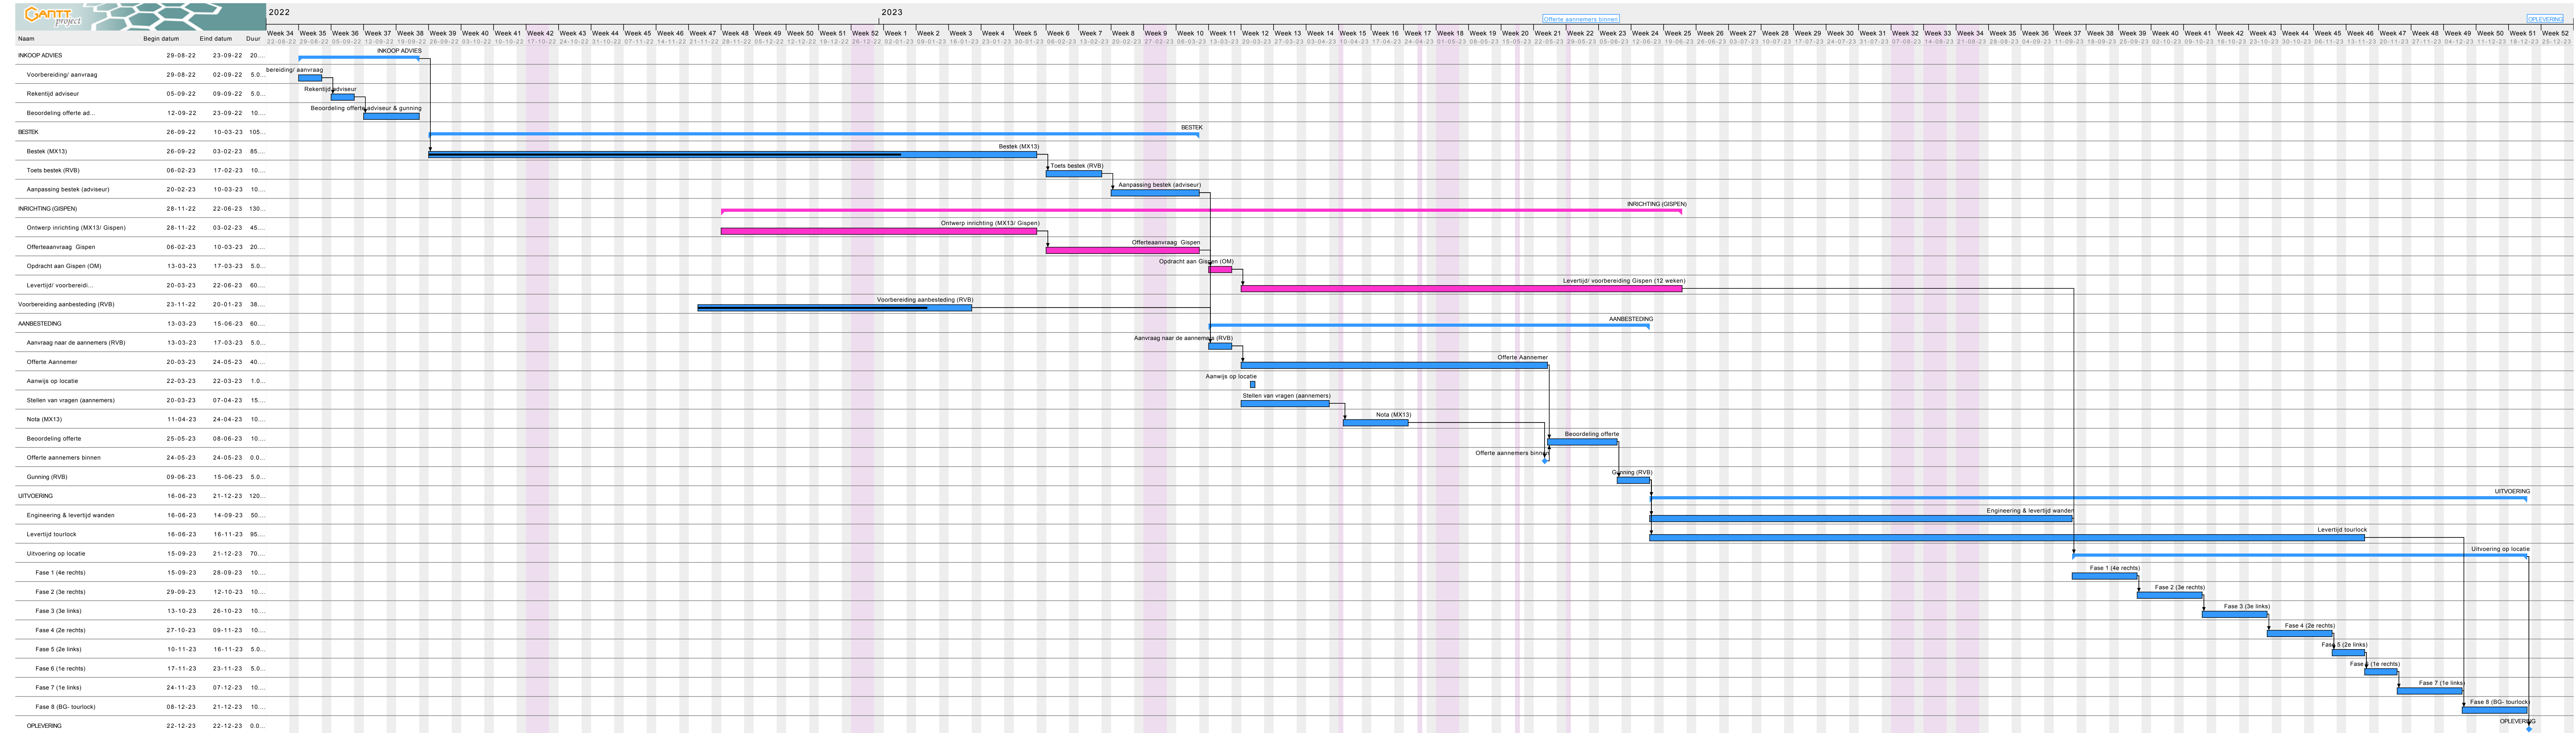

Personen-grafiek

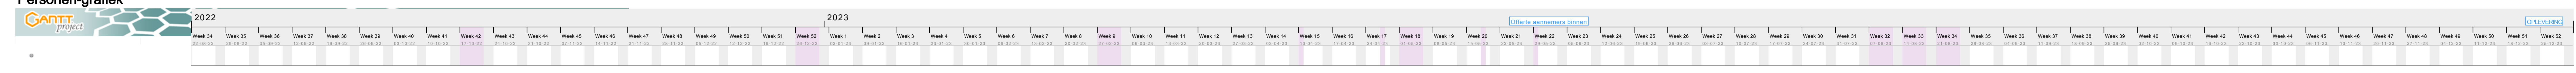

•
