

Chef de projet	
Dates du projet	24 juin 2024 - 11 juil. 2024
Avancée	0%
Tâches	41
Ressources	0

## Tâches

Numéro hiérarchique	Nom	Date de début	Date de fin	Durée	Intervenant
1	DELTA STER SALE	24/06/24	10/07/24	14	
1.1	PHASE 1	24/06/24	05/07/24	10	
1.1.1	A-Vider le local	24/06/24	24/06/24	1	Ster
1.1.2	A-Adapt arrivées d'eau+carottage+installation décharge	25/06/24	25/06/24	1	Vervaert
1.1.3	A-AC (Heyer)	25/06/24	25/06/24	1	Heyer
1.1.4	A-Electricité	26/06/24	26/06/24	1	Equans
1.1.5	A-Installation prises data	26/06/24	26/06/24	1	Equans
1.1.6	A-Placement Décochoc	26/06/24	27/06/24	2	Isotrim
1.1.7	A-Intégration d'une vitre étanche (si possible)	27/06/24	28/06/24	2	Isotrim
1.1.8	Jours réserves	01/07/24	02/07/24	2	
1.1.9	A&C-HVAC upgrade	25/06/24	05/07/24	9	TerraElec
1.2	PHASE 2 - Ultrasons OK/éviers HS - B	01/07/24	06/07/24	6	
1.2.1	B-Installation d'une cloison provisoire (bâche)	01/07/24	01/07/24	1	Serv. Tech
1.2.2	B-Prépa des différents tech dans Fx-PI,etc	01/07/24	02/07/24	2	Equans
1.2.3	B-Montage 2 cloisons dans couloir (D.A02_O06.02)	01/07/24	01/07/24	1	Serv. Tech
1.2.4	B-Dém. évier et deconnexions (Rotation évier) dans couloir	03/07/24	03/07/24	1	Ultrasonic
1.2.5	B-Prépa des différents tech dans Fx-PI,etc	03/07/24	04/07/24	2	Heyer
1.2.6	B-Adaptation des techniques	03/07/24	04/07/24	2	Heyer
1.2.7	B-Adaptation des techniques	03/07/24	04/07/24	2	Vervaert
1.2.8	B-Adaptation des techniques	03/07/24	04/07/24	2	Equans
1.2.9	B&C-Localc C vers B - nuit du 3 au 4 juillet	03/07/24	04/07/24	2	
1.2.9.1	Coupure eau stérile à partir de 22h00	03/07/24	04/07/24	2	Vervaert
1.2.9.2	B-Prépa des différents tech dans Fx-PI,etc	03/07/24	04/07/24	2	Vervaert
1.2.9.3	remonatge des tuyaux	03/07/24	04/07/24	2	Vervaert
1.2.9.4	Enlevement de l'ancienne décharge	03/07/24	04/07/24	2	Vervaert
1.2.9.5	Mise en place de la nouvelle alimentation B	03/07/24	04/07/24	2	Vervaert
1.2.9.6	B-Décharge B selon cotes	03/07/24	04/07/24	2	Vervaert
1.2.9.7	C-Preparation tuyaux d'eau en attente C	03/07/24	04/07/24	2	Vervaert
1.2.10	Transfert Ultrasons C vers B et raccordement	05/07/24	05/07/24	1	Celio/Sterima
1.2.11	C-1 jour durant lequel manque 1 Ultrason	05/07/24	05/07/24	1	
1.2.12	A&C-TRAVAIL DE NUIT du 5 au 6/07	05/07/24	06/07/24	2	
1.3	PHASE 3 Ultrasons OK	03/07/24	10/07/24	7	
1.3.1	C-Déconnexion techniques et connection vers A nuit 4 au 5	05/07/24	06/07/24	2	Vervaert
1.3.2	C-Déconnexion techniques	03/07/24	04/07/24	2	Heyer
1.3.3	C-Installation d'une cloison provisoire	05/07/24	05/07/24	1	Serv. Tech
1.3.4	C-Déconnexion techniques	05/07/24	08/07/24	3	Equans
1.3.5	D-Ouverture de la cloison et ragréage entre A&C	08/07/24	09/07/24	2	Isotrim
1.3.6	A-Démontage porte+fermeture+Décochoc	08/07/24	09/07/24	2	Isotrim
1.3.7	Démontage cloison provisoire (tôt le matin)	10/07/24	10/07/24	1	
1.3.8	A-Transfert et raccordement de l'évier	10/07/24	10/07/24	1	Ultrasonic
1.4	PHASE 4 - a organiser lors d'un long week-end	27/06/24	27/06/24	1	

Diagramme de Gantt

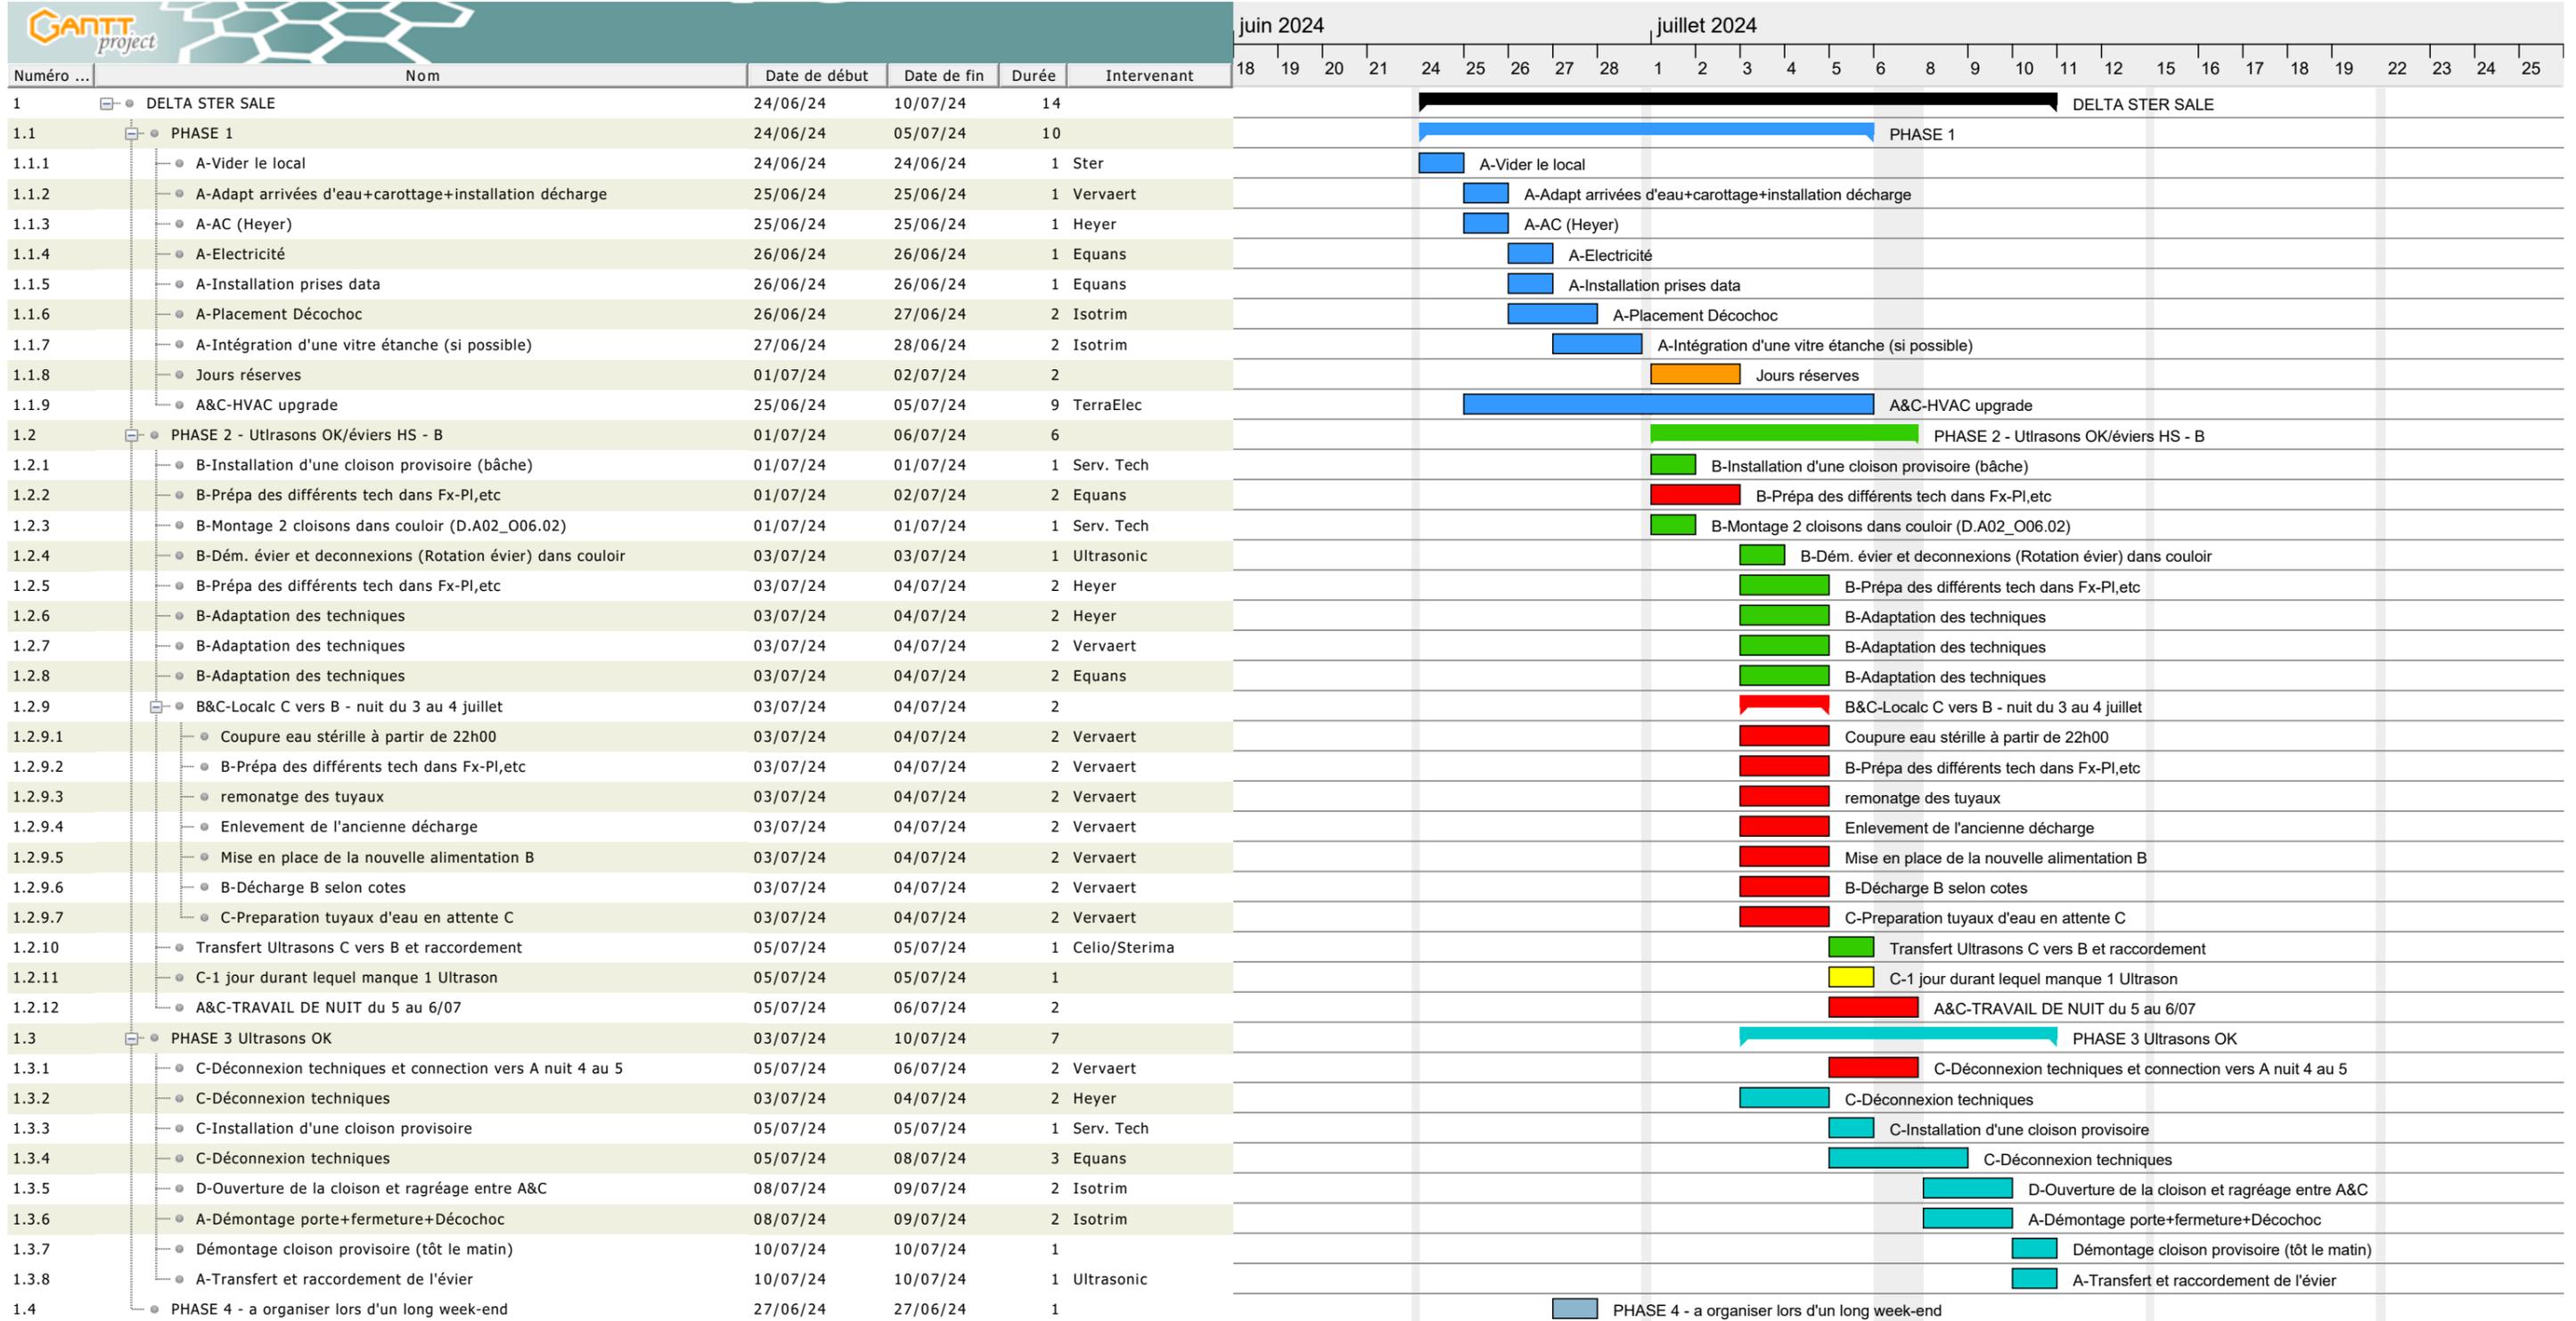


Diagramme des Ressources

